



Государственное унитарное предприятие  
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

**Филиал «Центр реализации  
инвестиционных программ»**

Смоленская ул., д. 27 А, Санкт-Петербург, 196084

Телефон (812) 326-52-51, факс (812) 326-52-50

E-mail: [DpS@vodokanal.spb.ru](mailto:DpS@vodokanal.spb.ru)

ОКПО 03323809 ОГРН 1027809256254

ИНН/КПП 7830000426/783450001

**Главе Администрации Заневского  
городского поселения**

**Гердий А.В.**

\_\_\_17.04.2025 г.\_\_\_ № \_\_\_126\_\_\_

Отключение холодного  
водоснабжения

**Уважаемый Алексей Викторович!**

Довожу до Вашего сведения, что в связи с производством работ по подключению объекта: «Водопроводные сети для подключения жилых комплексов с объектами социального значения (школы, поликлиники, детские сады), а также объектов промышленного назначения» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» с 10:00 21.04.2025 до 06:50 23.04.2025 будет прекращено холодное водоснабжение на водомерном узле по адресу: деревня Заневка, ул. Заозерная, д. 1. Для обеспечения временного водоснабжения на период строительно-монтажных работ будут установлены две прицеп-цистерны с питьевой водой по адресу: дер. Заневка: 1. Ул. Заозерная, д. 10; 2. пер. Яблоневский, д. 36.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

Приложение: 1. График производства СМР на 3-х листах.

**Заместитель начальника службы  
восстановления нарушенного  
благоустройства**

**А. Ю. Федоров**

Исп: Сорокин М.А.

89211882125

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

представитель администрации района

представитель ГУП «Водоканал СПб»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

представитель ГУЖА

представитель Филиала ВС

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

График № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

производства работ по:

врезке тройника Ø400×400×400 мм, с установкой затвора Ø400мм

(Место работ № 1)

врезке тройника Ø110×110×110 мм

(Место работ № 2)

по адресу: Деревня Заневка, строение 1 (Дорога на СВС)

с «18» апреля 2025 г.

до «20» апреля 2025 г.

№№ п./п.	Вид работ	Время начала работ	Время окончания работ
1	Подготовительные работы и проверка готовности к выполнению работ	21.04.2025 09:00:00	21.04.2025 11:00:00
2	Отключение участка водопроводной сети	21.04.2025 10:00:00	21.04.2025 13:00:00
3	Строительно-монтажные работы	21.04.2025 13:00:00	21.04.2025 22:00:00
4	Наполнение трубопровода, промывка водопроводных сетей	21.04.2025 22:00:00	23.04.2025 06:10:00
5	Полное включение водопроводной сети	23.04.2025 06:10:00	23.04.2025 08:00:00
6	Засыпка котлована	-	-
7	Отключение абонентов от услуги водоснабжения	21.04.2025 10:00:00	23.04.2025 06:50:00

Ответственный за производство работ от:

ЦРИП

(подрядная организация)

*С.А. Специалист РВБ*  
(должность)

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр реализации инвестиционных программ»  
Управление стратегических проектов подключения и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения  
(подпись)

*Александр С.Ю.*  
(Ф.И.О., печать организации)

телефон: +7-903-098-88-21

Для документов

Ответственный за производство работ от подразделения филиала Водоснабжения

Начальник участка

(должность)

Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга»  
Территориальное управление водоснабжением «Восточное»  
Район Восточный  
(подпись)

Боровиков Дмитрий Алексеевич

(Ф.И.О., печать организации)

телефон: +7-921-890-50-29

1. прекращено водоснабжение:

Заозерная ул., д.1 (водомерный узел СНТ) – Приложение № 1

(жилые дома, пром. предприятия и т.д. поадресно)

2. абоненты находящиеся на временном водоснабжении, понижено давление в микрорайоне, отключен один из вводов:

Деревня Заневка, стр.1 (Складская зона) – отключен один из вводов

(жилые дома, пром. предприятия и т.д. поадресно)

3. пункты временной раздачи питьевой воды (стендер, прицеп-цистерна): ~ 2 шт.

Деревня Заневка: 1. ул. Заозерная, д.10, 2. Яблоневский пер, д.36

(количество и адрес установок)

проинформированные абоненты

№№ п./п.	наименование	телефон	дата	Ф.И.О., должность, подпись, печать
1	Заозерная ул., д.1 (водомерный узел СНТ)			
2	Деревня Заневка, стр.1 (Складская зона)	921963985	16.04.25	Кис...



4. информация об отключении:

4.1 участок выключения водопроводной сети:

- Ø 400 мм.
  - Материал трубы сталь
  - Год прокладки 1965
- По Дорога на Заневку

4.2 водоотливная техника подрядчика \_\_\_\_\_ ед./общей производительностью \_\_\_\_\_ м3/час

4.3 техника подрядчика для выполнения работ \_\_\_\_\_

4.3 Арматура подготовлена:  
ответственный от района: Береснев Е.А.

5. перед началом работ подрядная организация обязана:

Предоставить в Службу оперативного управления за 1 час до начала работ фотографии с места производства работ (ограждение места и информационный щит согласно установленным норм и правил)

**Графики со всеми приложениями предоставлять в СОУ не позднее, чем за 24 часа до начала производства работ, до 16:00 рабочего дня**

Приложения:

1. регламент на производство работ
2. схема выключения водопроводной линии
3. разрешение ГАТИ, и при ограничении движения согласованную схему ОДД
4. модель гидравлического расчета в соответствии с регламентом (на диаметрах 500мм и выше)

Руководитель подрядной организации ознакомлен

**Руководитель района**  
 Голосовский А.В.  
 (подпись, должность, Ф.И.О., печать)

**Руководитель ТУВ**  
 Ильин Д.А.  
 (подпись, должность, Ф.И.О., печать)

Сектор по неосновной деятельности

\_\_\_\_\_ (подпись, должность, Ф.И.О., печать)


« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

От: <u>Д. Зановин</u> <u>стр. 1</u>	Закрывать задвижки №№:	Кол-во задвижек:	Без водоснабжения:		Выключил: Ф.И.О.; время; дата;	Задвижки №№:	Кол-во оборотов:	Принял диспетчер СОУ:	Включил: Ф.И.О.; дата; подпись;	Задвижки №№:	Кол-во оборотов:	Принял диспетчер СОУ:
			д/ввода:	ПГ:								
До: <u>Заозерная, д. 1</u>	<u>2, 3, 9</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>4</u>								
	<u>10/16/19</u>											

Объекты социального назначения:

Адреса пунктов водораздачи (стендер, прицеп-цистерна):

KAD ↑

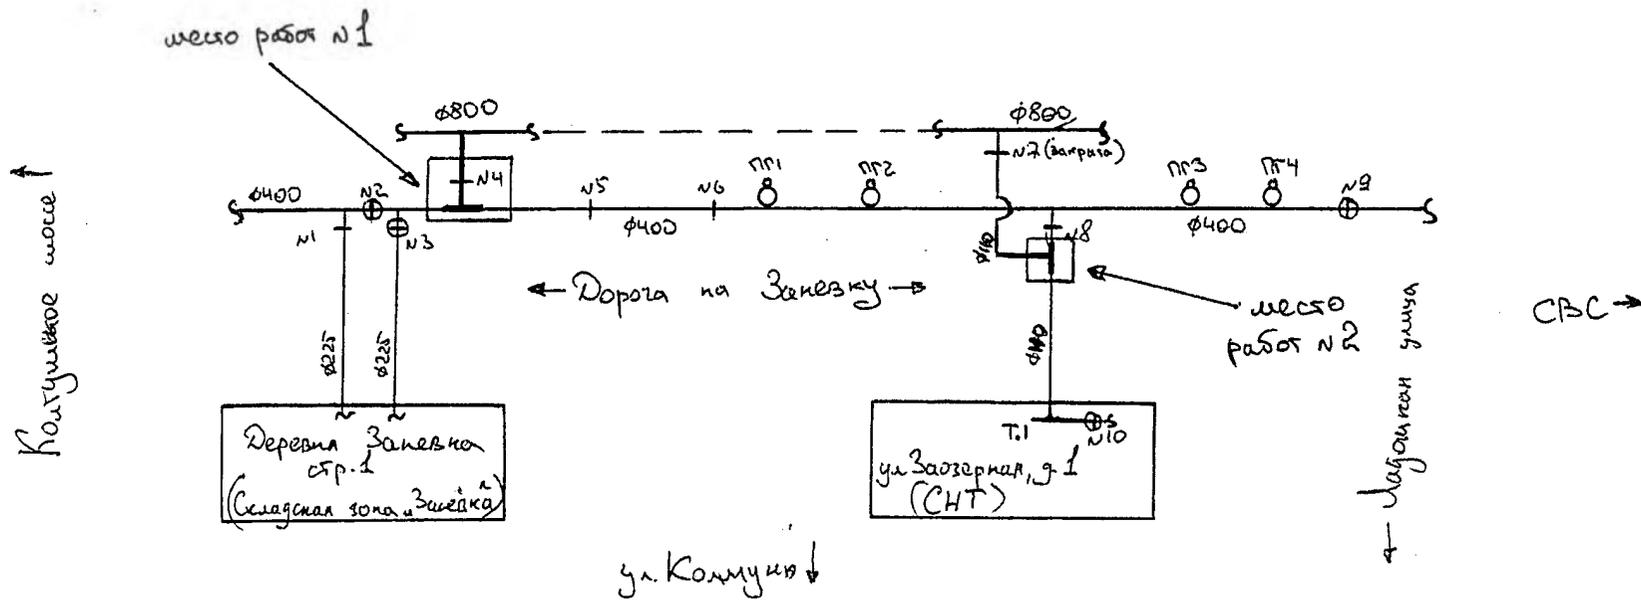

Пробное выключение выполнил:

дата

подпись

Ф.И.О.

Схему составил:

14.04.2025

дата

*[Handwritten signature]*

подпись

Боровиков Д.А.

Ф.И.О.

Схему проверил:

14.04.2025

дата

*[Handwritten signature]*

подпись

Матвева Т.О.

Ф.И.О.

На схеме указывать: координатные таблички задвижек, номера домов, закольцовки домовых вводов.
